

Bauabschnitt 1.2 = 600m²

Leitungssanierungen:

Fernwärme: 13.04.2026 - 29.05.2026

Kabesignal: 13.04.2026 - 29.05.2026

Gas: 13.04.2026 - 08.05.2026 (FERTIG)

Trinkwasser: 01.06.2026 - 12.06.2026

Neugestaltung:

31.08.2026 - 27.11.2026

Bauabschnitt 2 = 1.460m²

Leitungssanierungen:

Fernwärme: 13.04.2026 - 29.05.2026

Kabesignal: 13.04.2026 - 29.05.2026

Gas: 13.04.2026 - 29.05.2026

Trinkwasser: 01.06.2026 - 19.06.2026

Neugestaltung:

Herbst 2027

Bauabschnitt 1.1 = 1.550m²

Leitungssanierungen:

Fernwärme: 09.03.2026 - 10.04.2026 (FERTIG)


Kabesignal: 09.03.2026 - 10.04.2026 (FERTIG)

Gas: 09.03.2026 - 10.04.2026 (FERTIG)

Trinkwasser: Herbst 25 u. 20.04.2026 - 15.05.2026

Neugestaltung:

31.08.2026 - 27.11.2026

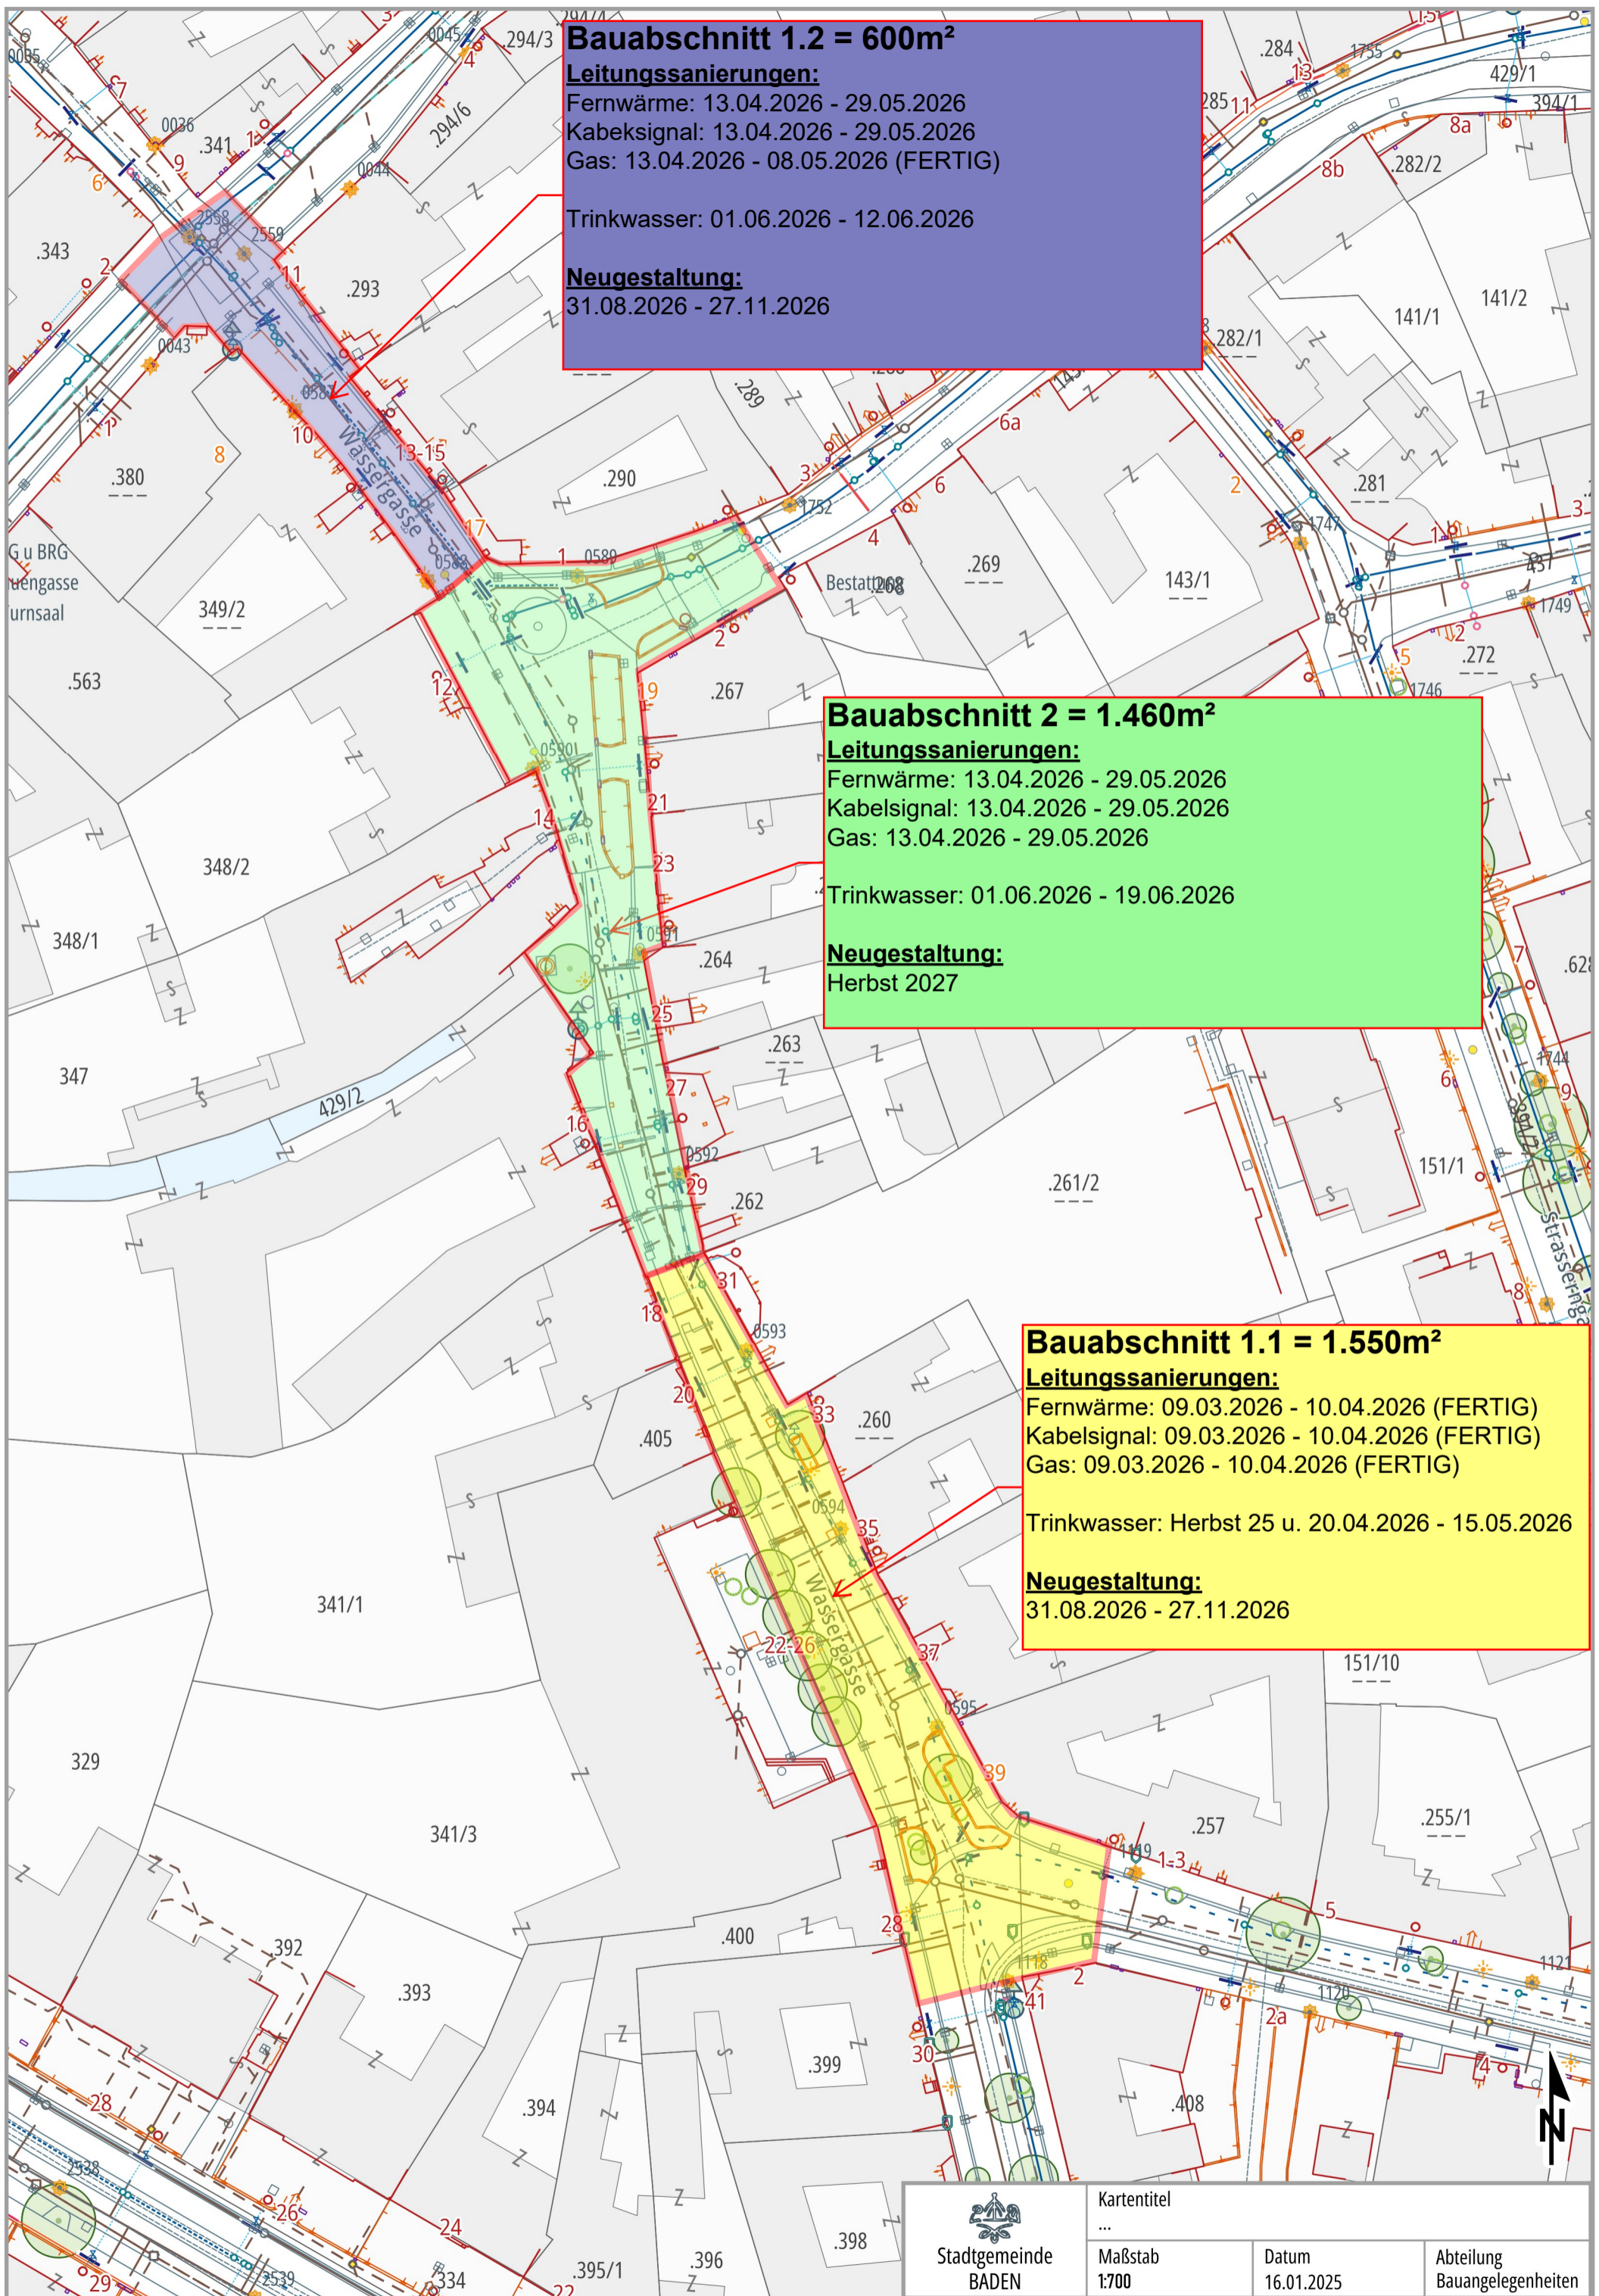

Stadtgemeinde
BADEN

Kartentitel

...

Maßstab
1:700

Datum
16.01.2025

Abteilung
Bauangelegenheiten
